中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园10·20较大高处坠落事故调查报告

2021年10月20日15时许，岑溪市马路镇中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园在建3号分拣楼发生一起较大高处坠落事故，造成2人当场死亡，1人送医抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，梧州市人民政府批准成立了中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园10·20较大高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急局、住房城乡建设局、公安局、人力资源社会保障局、总工会、邮政管理局等单位派员参加，全面开展事故调查工作。同时，邀请梧州市人民检察院派员参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、专家论证和综合分析等工作，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人的处理建议和整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年10月18日，岑溪市中通吉网络技术有限公司对中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目检查时发现现场钢设备平台、设备洞口封堵施工人员未按施工方案施工、未采取个人安全防护措施等问题，当天向杭州恒立实业有限公司钢设备平台、设备洞口封堵工程负责人庄XX发出《工程联系函》要求停工整改。

杭州恒立实业有限公司钢设备平台、设备洞口封堵工程负责人庄XX根据《工程联系函》整改要求督促王XX、杨XX、杨XX等3名安装作业人员停工整改，岑溪市中通吉网络技术有限公司在10月19日复查中发现王XX等3人未整改到位且仍在冒险施工，岑溪市中通吉网络技术有限公司当天约谈了庄XX，庄XX于19日下午向王XX发出《工程暂停施工通知书》要求其立即整改，整改后报项目部验收合格才能继续施工。

2021年10月20日14时30分许，负责中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目3#分拣楼钢设备平台、设备洞口封堵施工人员王XX、杨XX、杨XX等3人擅自到3#楼三层设备洞口施工作业，3人没有按照设备洞口封堵施工方案施工，水平洞口在拆除原土建施工单位设置的安全防护设施后，没有按照设备洞口封堵施工方案搭设好水平防护措施，也不按拆一个安装一个的工序，且在没有佩戴安全帽和系安全绳的情况下实行洞口封堵作业，在作业时从三层洞口上坠落至垂直高度约17.6米的一层地面。

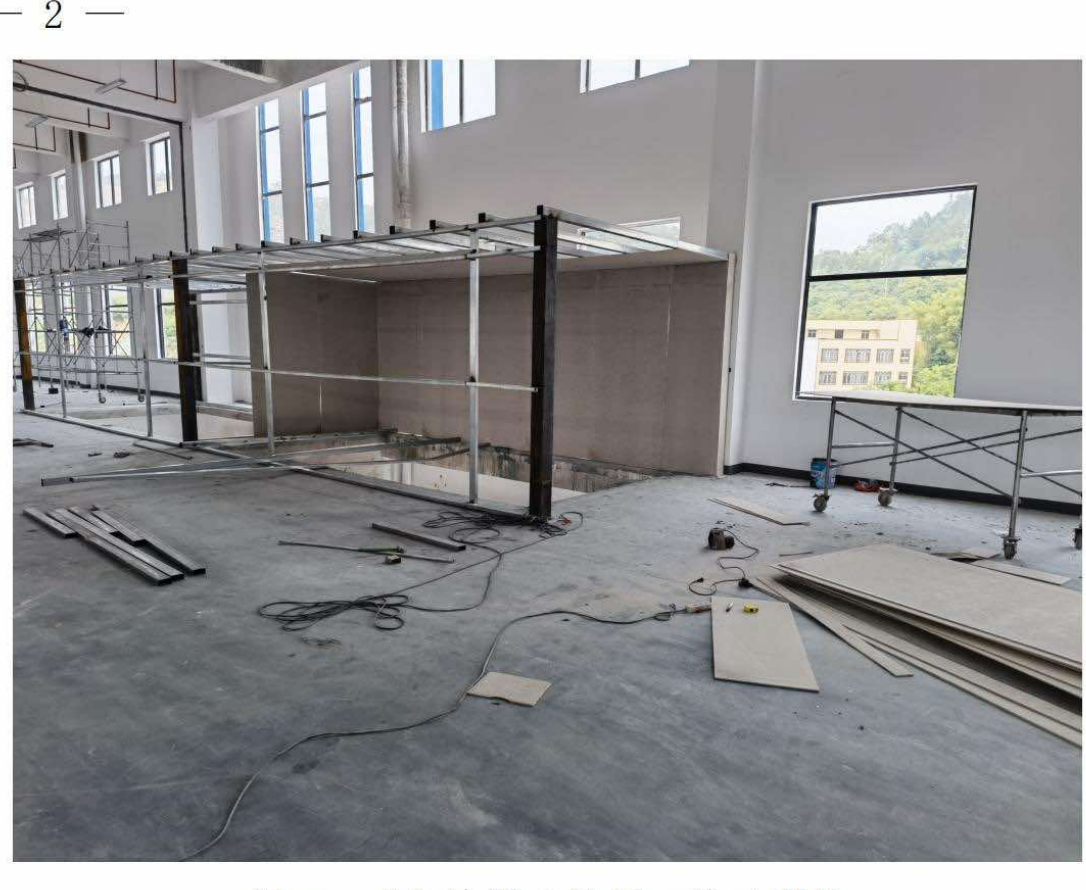

图1　3#分拣楼三层洞口施工现场

（二）应急处置情况

10月20日15时许，岑溪市公安局马路派出所接到110指令，与报警事主核实事故地点和人员伤亡简要信息，迅速向上级部门报告，并派出民警前往现场进行勘查。

15时10分，救护车到达现场，医护人员现场确认王XX、杨XX当场死亡，对杨XX进行紧急救护后送岑溪市医院抢救无效死亡。

15时20分，岑溪市政府、应急管理局、住房和城乡建设局赶赴现场指导开展救助工作，责令涉事企业立即停止危险作业，全面配合事故处理工作。

经评估，中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园10·20较大高处坠落事故中涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，在事故应急救援处置未发生次生事故和衍生事件，社会面舆情总体稳定。

（三）事故伤亡和经济损失情况

1. 事故造成3人死亡，基本情况如下：

（1）死者王XX，男，44岁，汉族，身份证号码：41282219780505XXXX，住址：河南省泌阳县板桥镇XXXXXX。2021年10月10日杭州恒立实业有限公司与王XX签订了《简易劳动合同》，聘用其为安装工。持有杭州市城乡建设委员会颁发《建筑普通脚手架架子工》证，证书编号：浙A021201200XXXX，有效期：2012年10月15日至2022年10月15日。

（2）死者杨XX，男，35岁，汉族，身份证号码：41282219870508XXXX，住址：河南省驻马店市驿城区板桥镇XXXXXX。2021年10月10日杭州恒立实业有限公司与杨XX签订了《简易劳动合同》，聘用其为安装工。持有杭州市城乡建设委员会颁发《建筑普通脚手架架子工》证，证书编号：浙A021201700XXXX，有效期：2021年8月31日至2023年8月31日。

（3）死者杨XX，男，51岁，汉族，身份证号码：41282219710205XXXX，住址：河南省驻马店市驿城区板桥镇XXXXXX。2021年10月10日杭州恒立实业有限公司与杨XX签订了《简易劳动合同》，聘用其为安装工。持有杭州市应急管理局颁发《焊接与热切割作业》证，证书编号：T41282219710205XXXX，有效期：2021年5月17日至2027年5月16日。

2. 事故共造成3人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失为人民币叁佰肆拾叁万元整（￥3430000）。

二、基本情况

（一）项目概况

中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目位于岑溪市岑兴高速马路出口旁，总投资5亿元，计划用地约150亩，总建筑面积约12万平方米，建设快运分拣车间、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心、倒班楼等主体工程及公共设施、停车场等配套辅助工程。

事故发生地点为项目3#楼分拣车间，主体结构已封顶，该车间地上4层，层高：一层9.7米，二三层7.9米，四层7.05米，设计采用车库式防护棚做法，对预留设备洞口进行封堵。

（二）相关单位基本情况

1. 杭州恒立实业有限公司

杭州恒立实业有限公司（以下简称杭州恒立公司），为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程承包单位，统一社会信用代码91330122MA2H3DXXXX（1/1），类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路XXXX，法定代表人为徐X，注册资本为贰亿元整，成立日期为2020年4月8日，经营范围为：城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料生产专用机械制造，国内货物运输代理，机械设备租赁，运输设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集装箱租赁服务，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，再生资源销售，金属结构销售，灯具销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），（分支机构经营场所设在桐庐县富春江镇俞赵工业园区）。

2021年7月14日由浙江省住房和城乡建设厅颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D23332XXXX，资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级。有效期：2021年6月26日至2025年7月1日。

2021年7月16日由浙江省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字（2021）019XXXX，许可范围为建筑施工，有效期：2021年7月16日至2024年7月15日。

2021年8月30日，岑溪市中通吉网络技术有限公司和杭州恒立实业有限公司签订了《工程合同协议书》，合同约定杭州恒立实业有限公司为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程承包方。计划开工日期为2021年8月30日，计划竣工日期为2021年10月30日，工期为60天。

2021年9月25日，杭州恒立实业有限公司与王XX签订《劳务承包协议书》，由王XX承包中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程2#、3#楼各层的工艺洞口封堵，施工工期为2021年10月10日至2021年11月10日。

2021年9月30日，岑溪市中通吉网络技术有限公司和杭州恒立实业有限公司签订了《工程施工安全生产管理协议》，明确中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程中双方的安全生产责任。

2021年9月30日，浙江宏兴建设有限公司和杭州恒立实业有限公司签订了《工程施工安全协议》，明确中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程中双方的安全生产责任。

2021年10月10日，杭州恒立实业有限公司分别与王XX、杨XX、杨XX签订《简易劳动合同》，聘用3人为安装岗位，时间为2021年10月10日至工作任务完成时止。

2. 岑溪市中通吉网络技术有限公司

岑溪市中通吉网络技术有限公司（以下简称岑溪中通公司），为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目业主，统一社会信用代码91450481MA5NUXXXX（1-1），类型为有限责任公司（自然人投资），住所为岑溪市紫坭工业园区岑溪市科宇电子有限公司X幢厂房XXX，法定代表人李XX，注册资本为伍仟万圆整，成立日期为2019年6月13日，经营范围为：计算机网络技术的开发，计算机网络系统软件集成、技术转让，计算机软件的设计、制作、销售，计算机软件的技术咨询与服务，物业管理，仓储服务（危险化学品、易燃、易燃物品除外），道路货运代理，企业管理咨询，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）岑溪中通公司是中通快递集团子公司，为中通快递集团电商快递产业链桂东区域性总部。

2020年9月16日，岑溪中通公司与浙江宏兴建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定工程范围为：1.土建工程包括但不限于：桩基工程、土方工程、主体钢筋砼结构工程、防水工程、防火门工程、砌筑工程、墙柱面工程、楼地面工程、天棚工程、保温工程、栏杆等工程量清单内容；2.包含施工图和施工方案中的水电安装工程，包括但不限于：给排水安装工程，强、弱电的安装工程，智能化系统等专业工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电、用水、设备电器等工程量清单内容。工期为395天。

3. 浙江宏兴建设有限公司

浙江宏兴建设有限公司（以下简称浙江宏兴公司），为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目施工单位，统一社会信用代码91330122143591XXXX（1/4），类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为桐庐县XXX，法定代表人余XX，注册资本为壹亿贰仟万元整，成立日期为1992年7月27日，经营范围为：房屋建筑工程施工总承包（一级），市政公用工程施工总承包（二级），建筑装饰装修工程设计与施工（一级），建筑幕墙工程设计与施工一体化（二级），土石方工程专业承包（三级），城市及道路照明工程专业承包（三级），建筑智能化专业承包（三级），机电设备安装工程专业承包（二级），防腐保温工程专业承包（凭资质经营），地基基础工程专业承包（凭资质经营），消防设施工程专业承包（凭资质经营），园林绿化工程（凭资质经营），销售：建筑装饰材料、机械设备、机电产品、绿化苗木、花卉盆景、五金工具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年11月30日由住房和城乡建设部颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D13304XXXX，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期至2021年12月31日。

2019年11月1日由浙江省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，证书编号：（浙）JZ安许可证字〔2005〕010XXX），许可范围为建筑施工，有效期：2020年1月13日至2023年1月12日。

4. 中泰天顺集团有限责任公司

中泰天顺集团有限责任公司（以下简称中泰天顺公司），为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目监理单位。统一社会信用代码91511700709175XXXX，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为达州市西胜街港都月光城XXXX，法定代表人李XX，注册资本为壹亿元整，成立日期为1997年1月14日，经营范围为：工程监理综合资质，工程设计，工程造价，工程咨询，工程招投标代理，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁服务，工程项目管理，工程材料咨询服务，广告设计、制作、代理、发布，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程，地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、机场场道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、城市园林绿化工程，建筑劳务分包，建筑工程机械设备租赁，销售建筑材料，建筑工程施工，职业技能鉴定服务，一般物品鉴定服务，工程勘察活动，消防设施维护保养检测，飞机场用电气交通管理设备制造，机场场面活动引导信号装置制造，机场货场服务，飞机场用电气号装置制造，自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年6月22日由住房和城乡建设部颁发《工程监理资质证书》，证书编号：E15100XXXX，资质等级：工程监理综合资质，可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务，有效期：2016年6月22日至2022年12月31日。

2020年8月20日，岑溪中通公司与中泰天顺公司签订了《建设工程监理合同》，由中泰天顺公司对中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目监理服务，工期为14个月（另免费服务期为2个月）共计监理服务期为16个月。

（三）相关监管部门情况

1. 岑溪市马路镇人民政府、岑溪市马路镇乡村建设综合服务中心

岑溪市马路镇人民政府是中通快递桂东（岑溪）中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目所属地乡镇人民政府，岑溪市马路镇乡村建设综合服务中心是岑溪市马路镇人民政府管辖的事业单位。自2021年1月19日至10月16日间，岑溪市马路镇人民政府、岑溪市马路镇乡村建设综合服务中心工作人员对中通快递桂东（岑溪）中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目开展建筑（建材）行业安全生产检查5次，共发现隐患问题4项，要求岑溪市中通吉网络技术有限公司进行整改完成后方可继续施工。

2. 岑溪市住房和城乡建设局、岑溪市建设工程质量安全管理站

岑溪市住房和城乡建设局是中通快递桂东（岑溪）中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目行业监管部门，岑溪市建设工程质量安全管理站是岑溪市住房和城乡建设局下属事业单位。从2020年10月28日项目报建报监起，岑溪市住房和城乡建设局和岑溪市建设工程质量安全管理站工作人员通过日常检查、节假日期间专项检查、季度安全生产大检查等形式对该项目进行了25次质量安全检查，发出《工程质量安全隐患限期整改通知书》5份，发出《工程质量安全隐患停工整改通知书》1份。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故的直接原因是：王XX、杨XX、杨XX等3人安全意识淡薄，在岑溪中通公司项目部发出停工通知期间，在没有现场管理人员在场监督的情况下，擅自到3#楼三层设备洞口进行施工。3人在未佩戴安全帽和系安全绳①等安全防护设备的情况下，拆除了原设置的安全防护设施后②，没有按照设备安装洞口封堵施工方案做好水平防护措施③，违规进行作业，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

经查，该事故间接的原因是：

1. 杭州恒立实业有限公司未落实安全生产主体责任，在停工整改期间没有认真落实整改，停工期间现场管理人员全部离开工程作业现场外出，对施工人员安全管理不到位，没有采取有效手段对施工人员进行管控，造成出现工地管理真空，致使3名施工人员在无人监管情况下擅自进入现场施工，致使事故发生。

---

①《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.05：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

②《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.9：安全技术措施，原则上不得变动和拆除。因施工作业要求必须临时拆除的，为施工安全考虑，规定必须采取对应的替换措施，并予以及时恢复。

③《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）5.2.3：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

2. 岑溪市中通吉网络技术有限公司未能认真履行安全管理职责，中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目机构只有1个人，管理人员不足，在直接委托杭州恒立实业有限公司进行钢设备平台、设备洞口封堵工作后，未落实对施工现场进行监督管理，也未对该工程聘请监理公司协助。

3. 浙江宏兴建设有限公司作为中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目土建总包单位，对于项目安全管理存在漏洞，对项目施工现场疏于管理，致使杭州恒立实业有限公司聘请的3名安装工在要求停工整改期间，仍能自由进出施工现场进行作业。

（三）事故性质

经调查认定，中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园10·20较大高处坠落事故是一起较大生产安全责任事故。

四、事故责任和处理意见

（一）免于追究责任人员

王XX、杨XX、杨XX等3人为杭州恒立实业有限公司安装工，在岑溪中通公司项目部发出停工通知期间，在没有现场管理人员在场监督的情况下，擅自到3#楼三层设备洞口进行施工，且未按照施工方案实施操作，未佩戴使用劳动防护用品违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于3人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关企业责任人员处理建议

1. 庄XX，作为杭州恒立实业有限公司中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园项目钢设备平台、设备洞口封堵工程现场负责人，负责施工现场安全生产全面管理工作，在停工整改期间没有认真落实整改，未有采取有效手段对施工人员进行管控，未认真督促检查项目的安全生产工作，对事故发生负有现场管理责任④。建议梧州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，依法对其给予行政处罚⑤。

2. 徐X，作为杭州恒立实业有限公司法定代表人，未落实安全生产主体责任，未切实履行安全生产管理职责和义务，未有效督促、检查项目的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任⑥。建议梧州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，依法对其给予行政处罚⑦。

（三）对有关企业处理建议

1. 建议梧州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，依法依规对事故责任单位杭州恒立实业有限公司给予行政处罚⑧。

---

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第五项、第六项、第七项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第二项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

2. 建议梧州市住房城乡建设局督促岑溪市住房和城乡建设局依法依规对事故责任单位浙江宏兴建设有限公司进行处理。

（四）其他建议

1. 建议岑溪市人民政府对杭州恒立实业有限公司、岑溪市中通吉网络技术有限公司、浙江宏兴建设有限公司进行约谈，并责成其作出深刻书面检讨。

2. 建议岑溪市人民政府责成岑溪市马路镇人民政府针对此次事故未有效了解掌握业主、施工等单位在项目中履行安全管理职责的相关情况，未及时发现、制止相关涉事单位在项目建设中存在违反安全生产规定的问题作出深刻书面检讨。

3. 建议岑溪市住房和城乡建设局对岑溪市建设工程质量安全管理站在此次事故未有效了解掌握业主、施工等单位在项目中履行安全管理职责的相关情况，未及时发现、制止相关涉事单位在项目建设中存在违反安全生产规定的问题进行约谈，并责成其作出深刻书面检讨。

4. 建议岑溪市人民政府责成岑溪市住房和城乡建设局针对此次事故未有效指导、督促岑溪市建设工程质量安全管理站依法依规监督、发现、制止相关涉事单位在项目建设中

---

⑧《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第二项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

存在违反安全生产规定的问题作出深刻书面检讨。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，更好地防范安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议做好以下工作：

（一）恒立公司要深刻吸取事故教训，针对事故发生暴露出来的问题，举一反三开展企业安全生产工作。一是要认真落实企业主体责任，严格执行各项安全生产法律法规，建立健全安全生产责任体系，加强对危险作业的安全管理，将安全生产责任逐级落实，真正落实到班组、个人。二是要强化施工现场的监督检查，坚决杜绝“三违”现象，要进一步完善岗位安全管理制度和安全操作规程，加强设备检维修、有限空间、登高、动火等作业现场监督检查，特种作业人员持证上岗，督促作业人员正确佩戴个体防护装备，及时发现、制止违章作业行为。三是要深入开展安全风险辨识，制定切实可行的安全风险管控措施，不断强化企业质量和生产过程管理，减少高处作业等高风险作业环节，降低生产过程中的固有安全风险。四是要严格落实岗位安全生产责任，加强从业人员安全教育培训和应急预案演练，增强员工安全意识和事故防范能力，切实防范事故发生。

（二）岑溪市中通吉网络技术有限公司要高度重视安全生产管理的重要性，加强项目部管理人员力量，逐一落实项目部、施工单位的管控责任，强化对存有较大风险点的施工环节和部位的管控。针对事故开展安全警示教育，坚决克服麻痹思想，杜绝违反安全技术要求违章违规施工和操作，同时针对劳务人员违章频发的现象，从技术上进一步完善现场管控措施。

（三）浙江宏兴公司要认真履行自身的安全生产责任，进一步加强施工现场安全管控，严格施工作业管理。施工过程中要科学制定施工方案，做好施工方案交底和施工组织，严禁不按审定方案施工。要加强施工现场安全管理，规范工艺工序和作业流程，强化对重点区域、重点环节、关键部位和危险作业项目的安全监控，落实人员、设备、物资等安全管控措施。要合理安排工程进度，严禁盲目抢工期，工期调整应进行充分论证，提出并落实相应安全保障措施。要配备充足的监理人员，切实做好施工现场监护和重大项目、重要工序等的旁站监理，督查现场安全措施的落实及施工人员的作业行为。

（四）中泰天顺公司要严格履行现场安全监理职责，审查施工单位安全施工方案，督促施工单位完善安全防护设施，强化现场巡查和隐患跟踪整改工作，及时发现、制止施工单位“三违”现象，防范事故发生。

（五）岑溪市人民政府要进一步强化辖区内企业安全监管，要突出事故隐患排查治理、危险作业管理等重点内容，扎实开展安全生产专项整治，对在检查中发现的违法违规行为要按照相关法律规定予以依法处理，及时消除各类事故隐患，推动安全生产形势稳定好转。要统筹好安全与发展的关系，认真履行安全生产属地管理职责，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，督促负有安全生产监督管理职责的部门开展监管行业领域大检查，细致排查和整改各类事故隐患，严厉查处各类安全生产违法违规行为，推动企业安全生产主体责任落实，确保辖区安全生产形势稳定。

（六）建筑行业各有关主管部门要进一步加强对全市在建工程的检查督查力度，坚决遏制建筑行业生产安全事故频发的势头。要重点检查建设工程相关单位开展自查自纠工作情况，检查企业防坠落、防电击、防坍塌、防风防雨等工作措施的落实情况，检查企业安全责任、安全管理机构、管理人员、安全投入以及安全防范设施等落实情况，检查企业日常安全隐患排查整治、安全培训教育等工作情况。要充分利用网络、公众号等渠道，大力宣传违章指挥、违规作业、冒险施工的危害，进一步提高建筑行业人员的安全意识和防范技能。

中通快递桂东（岑溪）智能科技电商快递产业园
10·20较大高处坠落事故调查组
2022年3月31日
