米东柏杨河新疆绿色建筑产业园“8·23”高处坠落事故调查报告

2023年8月23日19时许，位于乌鲁木齐市米东区柏杨河乡新疆绿色建筑材料产业园项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），成立了由乌鲁木齐市公安局米东区分局、区化工工业园、建设局（交通局）、区应急管理局（区矿山安全监督管理局）、区人社局、区司法局、柏杨河乡人民政府、区总工会等部门为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院参加此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任。提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因施工现场临边无防护措施造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：新疆中疆建置业有限公司，统一社会信用代码：91650109****HHE64B，类型：有限责任公司，法定代表人：刘**，成立日期：2019年09月19日，营业期限：

长期，住所：新疆乌鲁木齐市米东区石化中鼎街 1018 号 2 楼，经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务等。许可项目：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.施工单位：新疆安信建设集团有限公司，统一社会信用代码：91650100****235963，类型：有限责任公司，法定代表人：杨*，成立日期：2007 年 05 月 08 日，营业期限：长期，住所：新疆乌鲁木齐市天山区中环路 198 号幸福山庄，经营范围：房屋建筑工程施工、承包，建材生产及设备租赁，市政工程施工，装饰装修工程，钢结构工程施工，建筑幕墙工程施工等。

2023 年 4 月 1 日，新疆安信建设集团有限公司与新疆中疆建置业有限公司签订《建设工程施工合同》，工程批准文号 2020-650109-70-03-051726，工程名称：新疆绿色建筑材料产业园 9#、10#、11#标准化厂房，1#、2#、3#办公附属用房、门卫、配电室、600 立方消防水池。合同日期：2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。

3.施工劳务分包单位：新疆浩鸿信达建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91650102******18571,类型：有限责任公司，法定代表人：何**，成立日期：2023 年 02 月 22 日，住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路创新广场 G 座 904-1，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设

计；建设工程勘察等。一般项目：工程管理服务；市政设施管理等。

2023 年 3 月 1 日，新疆浩鸿信达建筑劳务有限公司与新疆安信建设集团有限公司签订《施工劳务分包合同》，项目名称：新疆绿色建筑材料产业园 9#、10#、11#标准化厂房、1#、2#、3#办公附属用房、门卫室、配电室、600 立方消防水池。工作期限：2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。单价 260 元/㎡。

4.监理单位：新疆路智兴项目管理有限责任公司，统一社会信用代码：91650100****19654T，法定代表人：路**，成立日期：2012 年 02 月 13 日，住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）河北东路 430 号 1 幢 17 层 B1706 号，经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程监理；各类工程建设活动。一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；工程管理服务；安全咨询服务等。

2023 年 4 月 1 日，新疆路智兴项目管理有限责任公司与新疆中疆建置业有限公司签订《建设工程监理合同》，工程项目：新疆绿色建筑材料产业园：1-3#办公附属用房、9-11#标准化厂房、门卫、配电室、600 立方消防水池项目。合同日期：2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 30 日。

（二）事故发生单位安全管理（监管）情况

1.新疆安信建设集团有限公司承建的新疆绿色建筑材料产业园项目建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程、应急预案等；成立了安全管理机构，明

确了安全管理职责；对新入职的劳务人员杨*玉开展了三级安全教育培训；对2#办公楼主体建设钢筋工程进行了安全技术交底。

2.新疆路智兴项目管理有限责任公司，依据监理工作职责审核同意了《钢筋工程专项施工方案》、《高空坠落及机械伤害预防措施专项施工方案》。提取的8月份监理工作资料有总监巡视记录13份、安全监理巡视记录17份、危险性较大工程巡视记录14份，下达监理通知单14份整改隐患38项，工地监理例会记录3份。

3.米东区建设局对新疆绿色建筑材料产业园项目进行安全监管。制定了该项目的《房屋（装饰）建筑施工安全监督工作计划》，签订了该项目的《房屋（装饰）建筑施工安全监督告知交底书》，从6月7日起至8月29日，对该项目进行9次安全检查，发现隐患46项，已整改完毕。对监理单位履职尽责情况没有检查。

4.柏杨河乡人民政府于4月17日、6月2日召开安全生产工作会议，通过“柏两园企业群”6次宣传提醒安全生产工作事宜，两园筹备组发放与安全生产有关的工作文件13份，8月18日对新疆绿色建筑材料产业园项目工地进行安全检查，发现3条事故隐患，已整改完毕。

（三）事故发生经过

2023年8月23日19时许，钢筋工杨**在2#楼4层楼梯间顶部平台，下班时走在没有防护栏杆的横梁上，摔倒坠落至横梁下方楼梯台阶上，姚**（杨**丈夫）、马**、张**、

李**、刘***听到响声，发现杨**趴在楼梯台阶上，姚**将杨**背至一楼门外。当时杨**意识清醒，称腰部和胳膊痛。

（四）事故现场情况

1.事故现场位于米东区甘泉堡工业园 99#地，绿色建筑产业园 2#办公附属用房，四层框架结构（见图 1）。



图 1

2.杨**摔倒时位置示意图。摔倒位置到落地位置高度约为 3.65 米，横梁宽约 0.4 米（见图 2、3）。

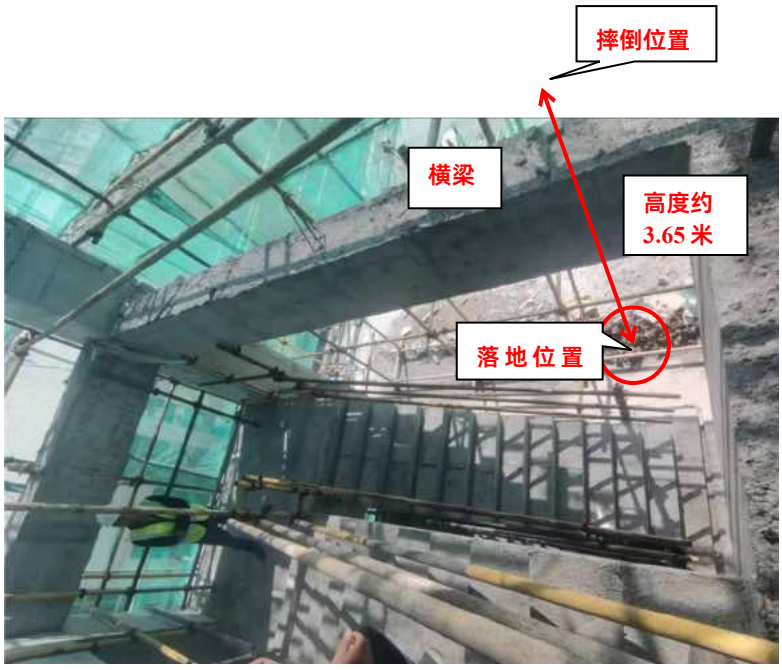


图 2



图 3

3.事故发生后，姚**将杨**背至一楼门外，杨**当时意识清醒，穿戴了安全帽和安全带（见图 4）。



图 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡。

2.此次事故造成的直接经济损失人民币 120 万元，主要为补偿金和医疗救治费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 8 月 23 日 19 时许事故发生时，姚**、马**、张**等 5 人在施工现场，李**电话通知了钢筋带班员陈**，陈**电话通知了项目安全员李**、现场监理陈**、钢筋班组负责人龚**。他们立即赶到现场，送杨**至新疆维吾尔自治区第三人民医院。龚**拨打了 110 报告，米东区柏杨河乡人民政府、区建设局、区应急管理局赶赴现场了解情况。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 8 月 23 日 19 时许，姚**、马**、张**等现场人员听到声响后，发现杨**趴在 4 层楼梯台阶上，姚**把杨**背到一楼门外，龚**、宋**驾驶私家车与姚**送杨**到新疆维吾尔自治区第三人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 8 月 23 日事故发生后，杨**被送至新疆维吾尔自治区第三人民医院进行医治，送医过程中杨**无昏迷、晕厥等情况发生。8 月 23 日晚做完手术，医生称手术成功，8 月 25 日杨明玉出现病情不稳定的情况，8 月 26 日 11 时 39 分，杨**因呼吸循环衰竭死亡，医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》。其家属质疑死因为医疗事故，向法院提出医疗诉讼。

（四）事故应急处置评估

事故发生后现场人员能及时将杨**送医救治，及时通知本单位现场负责人，应急处置得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

杨**在4层楼梯间顶部平台，下班走在没有防护栏杆的横梁上，摔倒坠落至楼梯台阶上。

（二）间接原因分析

1. 新疆安信建设集团有限公司承建的新疆绿色建筑材料产业园项目部未落实钢筋工程专项施工方案中预防高处坠落事故应对措施，四层楼梯间顶部平台、楼梯临边未设置防护栏杆。

2.新疆安信建设集团有限公司承建的新疆绿色建筑材料产业园项目部未及时排查整改四层楼梯间顶部平台、楼梯临边无防护栏杆的事故隐患，安全生产管理人员未履行职责。

3.新疆路智兴项目管理有限责任公司8月22日发现事故现场未采取临边防护措施，仅口头通知施工现场安全员李**进行整改，未履行监理职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新疆安信建设集团有限公司，未实施安全生产规章制度和操作规程，未落实全员安全生产责任制。安全生产主体责任落实不到位，8月份监理单位对施工现场出现的5次临边无防护措施、作业人未规范系挂安全带的事故隐患下达了监理通知单，8月22日依然存在此类事故隐患。未落实隐患排查治理工作机制，未及时消除临边无防护措施的生产安全事故隐患。

（二）新疆路智兴项目管理有限责任公司，未认真履行安全监理职责，未监督落实高空坠落及机械伤害预防措施专项施工方案。2023年8月22日，发现1#、2#办公附属用房

“四口五临边”的水平立面硬防护措施不到位、施工现场作业人员不正确佩戴安全帽、安全带的事故隐患，未给施工单位下达监理通知单，未采取措施督促施工方及时消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.杨*，新疆安信建设集团有限公司法定代表人、总经理，未组织实施安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作、未及时消除生产安全事故隐患。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[1]的规定对其予以行政处罚。

2.李**，新疆安信建设集团有限公司新疆绿色建筑材料产业园项目部安全管理人员，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实整改措施，未制止和纠正违反操作规程的行为。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定对其予以行政处罚。

3.新疆安信建设集团有限公司，建议由区应急管理局按

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[2][2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]的规定对其予以行政处罚。

4.新疆路智兴项目管理有限责任公司，建议由米东区建设局按照相关法律法规给予处理。

杨**家属质疑因医疗事故导致死亡，已向人民法院提出医疗诉讼。法院审判结果可能影响事故责任的认定，我局将根据法院审判结果，依据相关法律法规，修改对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

（二）其他处理建议

米东区建设局，履行安全生产责任不到位。建议由区人民政府约谈米东区建设局主要领导。

六、事故整改和防范措施

（一）新疆安信建设集团有限公司承建的新疆绿色建筑材料产业园项目要认真组织实施安全生产规章制度和操作规程、落实全员安全生产责任制、落实安全生产主体责任。组织落实隐患排查治理工作机制。举一反三，预防事故发生。

（二）新疆路智兴项目管理有限责任公司根据《建设工程监理规范》的要求，发现工程存在安全事故隐患时，应立即签发监理通知单，督促施工单位及时整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不

[3][3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

（三）米东区建设局应当加强对在建施工工地的安全生产监督检查，督促施工单位和监理单位及时排查整改事故隐患，形成事故隐患闭环管理，认真落实安全生产主体责任。

（四）柏杨河乡作为属地部门应当加强安全生产宣传教育，提醒企业做好隐患排查整改工作，防范生产安全事故的发生。
